


รายงานความก้าวหน้า
งานแก้ไขปัญหาท่อลอดถนนสุขุมวิทอุดตัน

นายธีรณัย เวชวิทย์วรากุล

วท.วบก.

ขั้นตอนการดำเนินการ

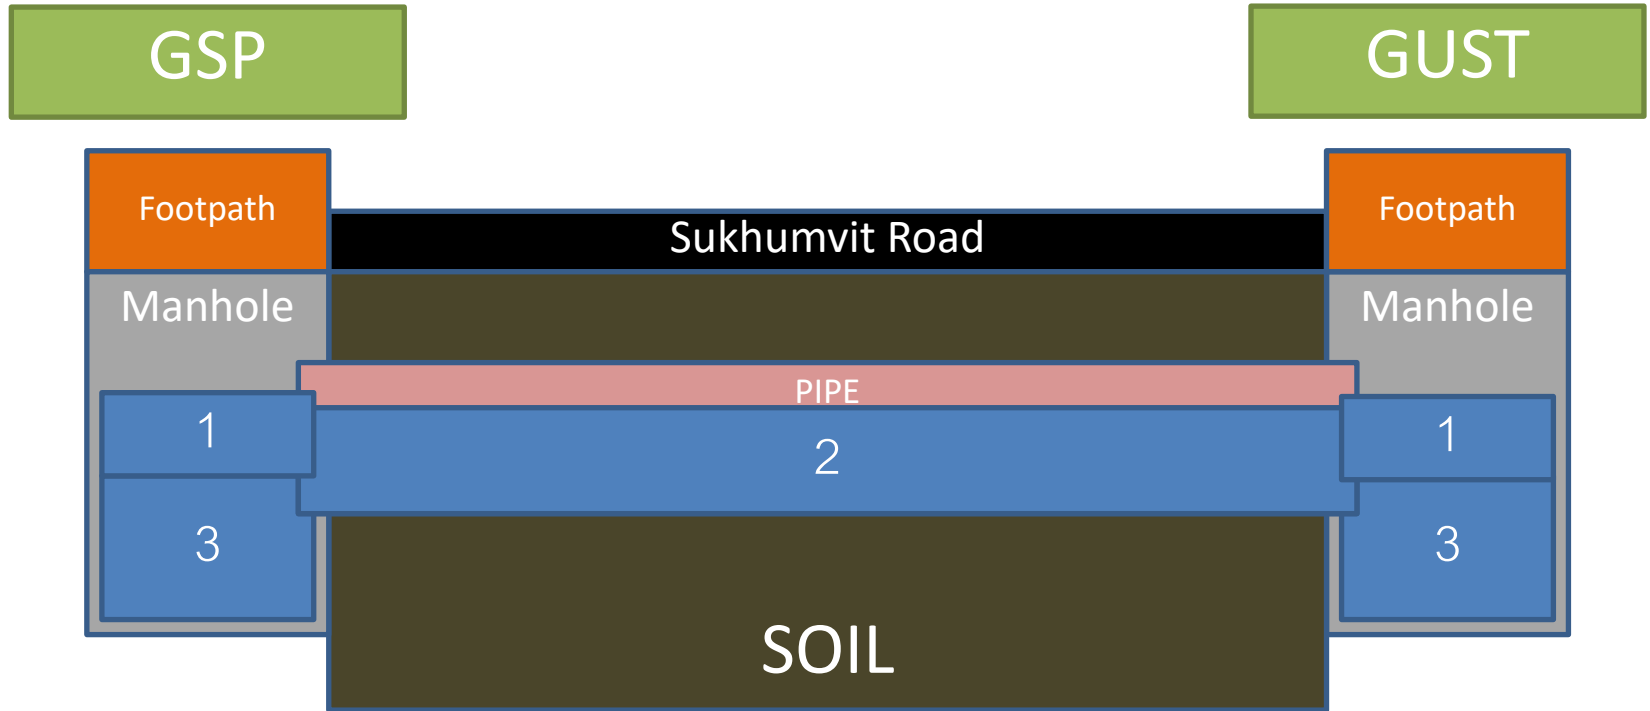

1. เคลียร์ดินที่ปิดปากท่อออก
2. เคลียร์ดินภายในท่อ
3. เคลียร์ดินในบ่อ manhole

ขั้นตอนการเตรียมงาน

- ติดตั้งป้ายเตือนและเสาค้ำสายโทรศัพท์



- ตรวจวัดปริมาณ O₂ ภายในก่อนลงปฏิบัติงาน



การดำเนินการแก้ไข

- วันที่ 8 ตุลาคม 2555



ทำการเคลียร์ดินใน **manhole** ที่ 1 เพื่อเตรียมติดตั้งสลิงที่จะใช้ในการดึงถังสำหรับโกยดินในท่อ พบเศษวัสดุประเภท สายไฟ ถังสี และกระสอบทรายอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก

การดำเนินการแก้ไข

- วันที่ 9 ตุลาคม 2555



ทำการติดตั้งอุปกรณ์ในการลอกท่อและใช้สลิงดึงจาก **manhole** ผังตรงข้ามโรงแยกก๊าซ พบเศษก้อนหินขนาดใหญ่ ถูขยี้ และทราบเป็นจำนวนมาก

การดำเนินการแก้ไข

- วันที่ 10 ตุลาคม 2555



ทำการเปิด **manhole** ที่ 2 เพื่อติดตั้งสลิงสำหรับติดอุปกรณ์ลอกท่อ และเริ่มลอกท่อต่อไปในช่วงบ่าย พบเศษวัสดุเป็นจำนวนมาก เช่น แผ่นไม้ ก้อนคอนกรีต ถูขย่ะ

การดำเนินการแก้ไข

- วันที่ 11 ตุลาคม 2555



ดำเนินการลอกเศษวัสดุ เช่น กระจบบทรายและอื่นๆบริเวณบ่อพักในพื้นที่โรงแยกก๊าซ

การดำเนินการแก้ไข

- วันที่ 14-15 ตุลาคม 2555



ดำเนินการนำกระสอบทรายและดินโคลนขึ้นจากบ่อ Man Hole บริษัท GUST ฝังตรงข้ามโรง
แยกก๊าซ และติดตั้ง Pump เพื่อดูดทรายและดินโคลนในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการลอกขึ้นมาได้

แผนการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป

1. จะทำการสำรวจและทำแบบระบบท่อลอดถนนสุขุมวิทอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการปรับปรุงในอนาคต
2. จะประสานงานกับทาง ผบ. ให้ช่วยทำแผนการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำของโรงแยกก๊าซ เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ
